

FAISM 2024
AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO
2020-2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, UNA VEZ QUE SE DA INICIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO SE DÉ CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.

MUNICIPIO: PISAFLORES LOCALIDAD: LA ESCONDIDA DE LO VERDE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO NOMBRE DE LA OBRA: EN CALLE A LA PRIMARIA Y CALLE DE ARRIBA EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA DE LO VERDE CONTRATISTA: MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: CONTRATO POLIZAS DE FIANZAS: ANTICIPO: CUMPLIMIENTO: VICIOS OCULTOS:	PROGRAMA: S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES NO. DE CONTRATO: MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-009 MONTO TOTAL: \$ 834,217.90 FECHA:				
	PROGRAMA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">INICIO</th> <th style="width: 50%;">TERMINO</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	INICIO	TERMINO		
INICIO	TERMINO				
OFICIO DE AUTORIZACIÓN: HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-049-005					

DESCRIPCIÓN GENERAL:

➡	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS	
	PRIMEROS 10,000 M2 , ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	560.00 M2
➡	EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL "B", SECO, EN SUPERFICIES MAYORES A 400 M2. Y MENORES A 1,200 M2., INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)	84.00 M3
➡	009-F.02 COMPACTACIONES: A) DEL TERRENO NATURAL EN EL AREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES: 3) PARA 85%	84.00 M3
➡	009-F.08 AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIÓN.	16.80 M3

FAISM 2024
AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO
2020-2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

➡	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA $f'c= 200$ KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	560.00 M2
➡	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE $1\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{8}$ ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE $1\frac{1}{2}$" x $\frac{1}{8}$" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 cm. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERA DE 54 X 62 cm. EL FONDO SERA EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACION DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERAN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISION, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	 1.00 PIEZA


OBSERVACIONES:




Delegada

2020-2024



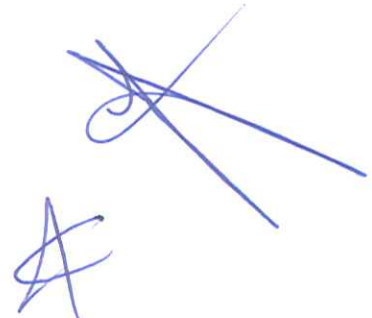

FAISM 2024
AYUNTAMIENTO DE PISAFLORES, ESTADO DE HIDALGO
2020-2024



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

ACTA DE INICIO

NOMBRES Y FIRMAS DEL COMITÉ DE OBRA.

Domingo Uribe
PRESIDENTE DEL COMITÉ

ING. FELIPE VEGA CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA

LIC. RICARDO GARCIA TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ISRAEL RICO LOPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

