

Fecha: 18/04/2024

No. 1

Apertura de bitácora

Con esta fecha abrimos la siguiente bitácora de la obra con las siguientes características:

Nombre de la obra: " Construcción de pavimento de concreto hidráulico por rumbo a la Ermita en la localidad de La Laguna "

Número de contrato: MP-D.O.P. - AD- FAISM/2024 -049-011

Dependencia: Municipio de Píscobres

Domicilio: Polígono Municipal sin colonia centro, Píscobres Hidalgo CP 42220

Nombre del contratista: Luis Ricardo Rubio Olguín

Domicilio: Calle Luciano Caballeros, no exterior: S/n, colonia centro Chapultuacán, C.p. 42290

Monto del contrato: \$ 1,059,521.04 (un millón nueve mil quinientos veintinueve pesos 04/100 M.N.)

Periodo de ejecución: 22 de abril de 2024 al 20 de julio de 2024

El horario para enterar notas será el siguiente de 08:00 horas a 18:00 horas

A continuación, se anexan las firmas autorizadas de las personas que intervendrán en la presente bitácora, así como los responsables del resguardo del mismo


Residente de supervisión

Superintendente de construcción



Ing. Luis Jonathan García García

Arq. Abelardo Chávez Martínez

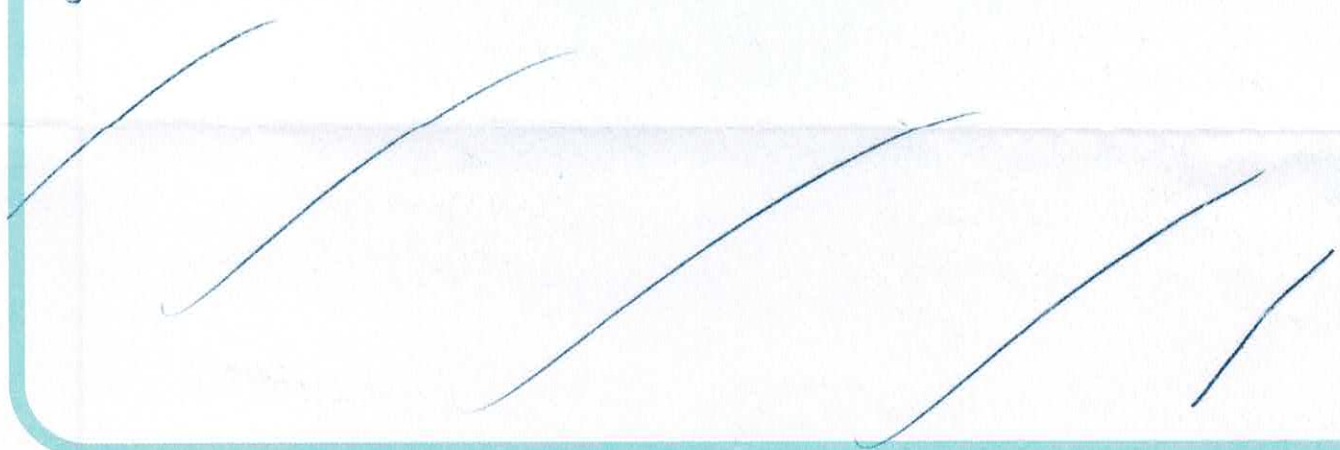

Fecha:

No.

2

Nota 01 22/04/2024

Al día de hoy lunes se recorre el tramo con personal de la empresa para el inicio de los trabajos donde se levanta el cota correspondiente de inicio, así como se hace la entrega del inmueble a la controlista. Después del recorrido se ordena a la empresa controlista iniciar con el trazo y nivelación del terreno.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing Luis Jonathan Guzmán González

Arq Abigail Chávez Martín

Nota 02 30/04/2024

Al día de hoy se le notifica a la residencia de supervisión de la conclusión de trazo y nivelación de terreno de este modo se continuará con la excavación de corte en cara así como con la compactación de terreno natural del tramo marcado.

Superintendente de construcción

Residente de supervisión

Arq Abigail Chávez Martín

Ing Luis Jonathan Guzmán González

Nota 03 06/05/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el superintendente de construcción para la verificación de los trabajos del corte en cara y compactación por lo que se puede ver la culminación de los mismos por lo que se le ordena a la empresa controlista continuar con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada del hombro derecho.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing Luis Jonathan Guzmán González

Arq Abigail Chávez Martín

Fecha:

No.

3

NOTA 04 13/05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EL CUAL SE PUEDE CONSTATAR UN AVANCE DE 20 METROS LINEALES

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ABO. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 05 17/05/2024

Con esta fecha se hace recorrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de la construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada tiene un cuadro de 25 metros lineales, Se le ordena que continúe con los trabajos de construcción de cuneta de 10 cm de espesor de 150 kg/cm² de resistencia

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing Luis Jonathan Gonzalez Gonzalez

Abg Abigail Chavez Martin

NOTA 06 21/05/2024

CON ESTA NOTA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DEL AVANCE EN LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, DEL MISMO MODO SE ENTREGA LA ESTIMACION 1 (UNO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 22 DE ABRIL DE 2024 AL 21 DE MAYO DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AD-FAISM/2024-049-011 PARA SU REVISION Y/O AUTORIZACION.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ABO. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

4

Nota 07 22/05/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 1 (obra) por lo que se autoriza para su pago, se solicita elaborar factura correspondiente, se le solicita que se continúe con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Abigail

Ing. Luis Jonathan González González

Arq. Abigail Chavez Martin

Nota 08 29/05/2024

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE NO HAN DESADO DE CESAR, LO QUE HA PROVOCAADO PERO SEGUIR TRABAJANDO CON LAS INCLIMENCIAS DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MEJORE EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail

ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 09 05/06/2024

AL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISION DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KS/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONSTRUIDOS 80 METROS LINEALES DEL HOMBRO DERECHO.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

Abigail

ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

5

Nota 10 17/06/2024

Con esta fecha se hace ocurrido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 200 Ks/cm² de 15 cm de espesor con malla electrosoldada de este modo se le ordena a la empresa contratista que inicie con el tramo faltante de piso.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González González

Arq. Abigail Chávez Martín

Nota 11 17/06/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA COLMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA CON LO QUE SE PROCEDERA A DESPACHE DE TERRENO DONDE SE COLOCARA LA CUNETA.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 12 20/06/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACION (2 CDS) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 22 DE MAYO DE 2024 AL 20 DE JUNIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AP-FAISM/2024-049-011 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE SUPERVISION

ARQ. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

6


Nota 13 21/06/2021

En relación a la nota anterior se realizó la revisión correcta de la estimación 2 (CDS) por lo que se autoriza para su pago, se le solicita elaborar la factura correspondiente, se le ordena que se continúe con los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 15 cm de espesor con malla electrosoldada del hombre izquierdo.

Residente de Supervisión

Superintendente de Construcción





Ing. Luis Jonathan González González

Arg. Abigail Chávez Martín

Nota 14 28/06/2021

CON ESTA NOTA NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA OBRA DERIVADO A LAS LLUVIAS QUE NO HAN DEJADO DE CESAR, LO QUE HA PRODUCIDO QUE SE SIGA TRABAJANDO CON LAS INCONVENIENCIAS DEL CLIMA POR LO QUE UNA VEZ MÁS QUE EL CLIMA SE CONTINUARA CON LOS TRABAJOS.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN





ARG. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 15 05/07/2021

AL DIA DE HOY NOTIFICO AL RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE OBRA DEL AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA, CONSTRUIDOS 100 METROS LINEALES CON UN ANCHO DE 3.00' PROMEDIO

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN





ARG. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

7

Nota 16 12/07/2024

Con esta fecha se hace recibido con el Superintendente de construcción para la verificación de los trabajos de construcción de piso de concreto hidráulico de 700 kg/cm² de 15 cm de espesor con malla electrosoldada de este modo se le ordena a la empresa contratista que inicie con el trazo faltante de piso y con la construcción de la guarnición de concreto simple.

Residente de Supervisión

Superintendente de construcción

Ing. Luis Jonathan González Gándiz

Abg. Abigail Chavez Martin

Nota 17 15/07/2024

CON ESTA FECHA NOTIFICO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA CULMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA Y DE UN ANACHE DE 100 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Nota 18 20/07/2024

CON ESTA FECHA INFORMO A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE, ASI COMO TAMBIEN SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN 3 (TÍTULOS FINIQUITO) CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL 21 DE JUNIO DE 2024 AL 20 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO CON NUMERO DE MP-D.O.P.-AR-FAISM/2024-054-017 PARA SU REVISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN.

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN

ABG. ABIGAIL CHAVEZ MARTIN

ING. LUIS JONATHAN GONZALEZ GONZALEZ

Fecha:

No.

8

Nota 19 21/07/2024

En relación a la nota anterior se realizó la revisión control de la estimación y (tres finiquito) por lo que se autoriza para su pago, se solicita elevar la factura correspondiente a dicha estimación, así mismo como el civil de bitácora del presente control de obra No. MP-P.O.P.-AD-FAISM/2024-079-011 de fecha 18 de abril de 2024 firmando en la que en ella intervinieron.

Presidente de Supervisión

Superintendente de construcción



Ing. Luis Jonathan González González

Arg. Abigail Chávez Marín

